

両総農業水利事業 南部幹線用水路その53工事だより(3月号)

(発注者)

農林水産省

関東農政局両総農業水利事業所

担当監督員：橋田、金谷

電話：0475-52-6262

(請負者)

株式会社 森組

両総南部用水路作業所

所長：五反田

住所：茂原市七渡620-9メゾン新茂原101号

電話：0475-20-2051




日頃より両総農業水利事業にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

工事もいよいよ最後の仕上げ段階となりました。引き続き今月も保護コンクリート、場内整備、現況復旧を行っています。皆様にはまわり道などで何かとご不便・ご不自由をおかけいたしますが、何卒、ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。また、最後まで安全第一で進めて参りますので、よろしくお願いいたします。

では、平成25年3月の工事の予定をお知らせいたします。

標準断面図

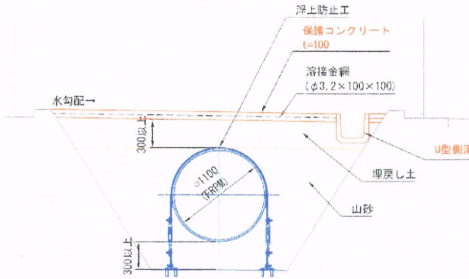

工事概要

工事名称：両総農業水利事業 南部幹線用水路その53工事

工事場所：千葉県茂原市七渡地内ほか

工事期間：平成24年7月19日～平成25年3月18日

工事内容：施工延長 L=1,075.770m

(測点H17-3No.93+30.370～H17-3No.115+11.300)

FRPM管(強化プラスチック複合管) 2種 呼び径1,100mm

L=994.489m (SL=994.489m)

鋼管 STW400 t=6mm 呼び径1,100mm L=81.2819m (SL=89.367m)

分水工 3箇所、制水弁工 1箇所、付帯工 1式


作業時間：8時00分～17時00分(通行止め9時00分～17時00分)

作業実施日：平日のみ(天候等による影響を受けるため、土・日、祝日は作業の

進捗状況により、作業をさせていただく場合があります。)

工事の進捗状況

- ・保護コンクリートを打設しています。
- ・七渡・新小轡分水工打設完了
- ・3号サイホンブレーカー打設完了




今月の主な工事内容

- ・排水側溝据付け、保護コンクリート打設、右岸側敷砂利(C55-3区間)
- ・阿久川・七渡分水工・78号空気弁室内整備
- ・3号サイホンブレーカー埋戻し、付帯工
- ・13号制水弁、流量計室内整備、付帯工
- ・整地、舗装復旧(C54区間)
- ・ネットフェンス復旧
- ・3月中旬から天然ガス管防護の仮舗装・敷き鉄板撤去(C55-3区間)
- ・仮設ヤード撤去、整地

今月の工事工程

工種	平成25年3月					
	5	10	15	20	25	31
管体保護工(C55-3)	U型側溝、保護コンクリート、敷き砂利					
13号制水弁、流量計室、阿久川・七渡分水工場内整備、付帯工	場内整備、フェンス復旧					
3号サイホンブレーカー埋戻し、付帯工	埋戻し、付帯工、フェンス復旧					
整地、舗装復旧(C54区間)	整地、防草シート、舗装復旧					
天然ガス管防護の仮舗装撤去・敷き鉄板撤去(C55-3)	仮舗装撤去、敷き鉄板撤去					
仮設ヤード撤去・整地、片付け	仮設ヤード撤去、片付け					

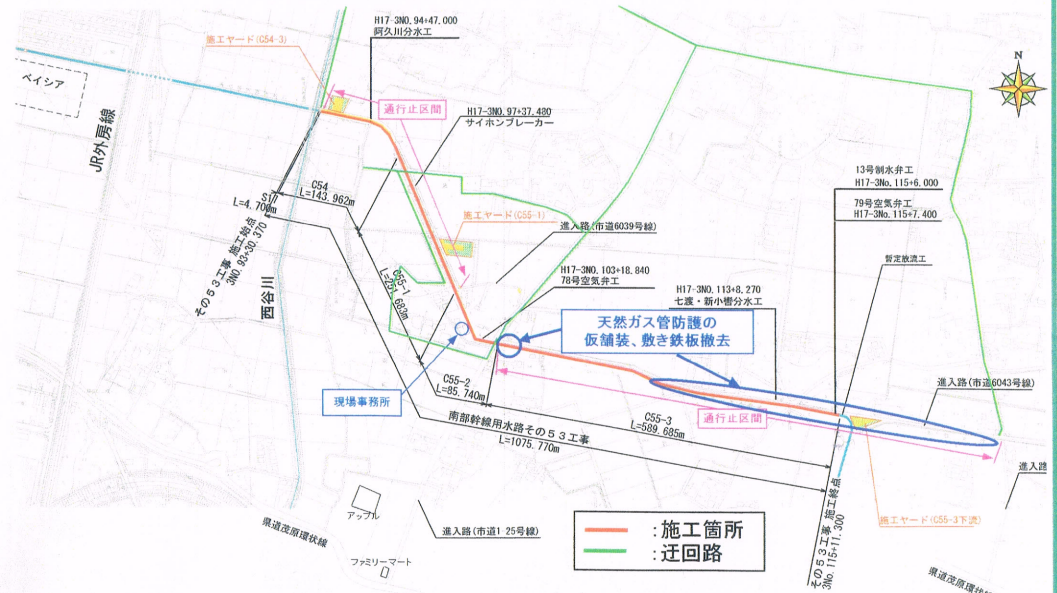

他にも工事についてのご意見などありましたら下記までご連絡をお願いいたします。
